



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA




RICOSTRUZIONE POST SISMA

30 OTTOBRE 2016 – 30 OTTOBRE 2022

Il percorso fatto insieme

sismaumbria2016.it





VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



RICOSTRUZIONE PRIVATA

30 OTTOBRE 2016 – 30 OTTOBRE 2022

Il percorso fatto insieme

sismaumbria2016.it

- Dall'inizio della ricostruzione al 30 Ottobre 2022 sono **pervenute** all'USR Umbria n. **3855 istanze** per la concessione di contributo (n. **2888** di **danno lieve** e n. **967** relative ai **danni gravi** del patrimonio edilizio abitativo e produttivo).
- È importante segnalare che delle istanze di **danno lieve**, n. **656 sono in carico ai comuni** di **Cascia, Norcia e Spoleto** che, secondo le previsioni dell'O.C. n. 99/2020, a partire dalla fine di ottobre del 2020 gestiscono l'istruttoria dei danni lievi.
- Premesso ciò, presso l'USR Umbria ed i Comuni sono state **accolte** n. **2544 istanze** e ad esse ha fatto seguito il **decreto di concessione contributiva**, mentre n. **427** sono state **respinte** e **199 archiviate** su istanza di parte, con una **percentuale di pratiche lavorate pari all'85% del totale (USR Umbria)**.

IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Fonte dati: DOMUS e Sistema CUP		O.C. n. 4/2016 Danni lievi	O.C. n. 13/2016 Immobili produttivi	O.C. n. 19/2017 Danni gravi
Istanze pervenute	3621	2868	90	663
Istanze accolte	2025	1601	46	378
Istanze respinte	389	353	9	27
Istanze archiviate	181	133	13	35
Percentuale istanze lavorate/pervenute		74%	76%	66%

**Stato ricostruzione
privata al
31 dicembre 2021**



UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA


Fonte dati: DOMUS e Sistema CUP		O.C. n. 4/2016 Danni lievi	O.C. n. 13/2016 Immobili produttivi	O.C. n. 19/2017 Danni gravi
Istanze pervenute	3855	2888	102	865
Istanze accolte	2544	1941	60	543
Istanze respinte	427	373	14	40
Istanze archiviate	199	141	13	45
Percentuale istanze lavorate/pervenute		85%	85%	73%

**Stato ricostruzione
privata al
30 ottobre 2022**

VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016




STATO istanze UMBRIA (USR+COMUNI)

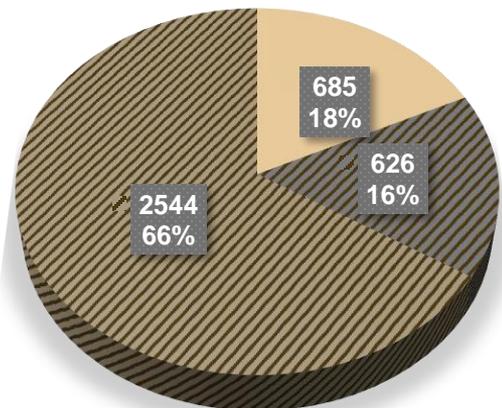

- ISTANZE IN ISTRUTTORIA AL 30/10/2022
- ISTANZE RIGETTATE/ARCHIVIAATE
- ISTANZE ACCOLTE

ISTANZE LAVORATE
82%


STATO istanze USR

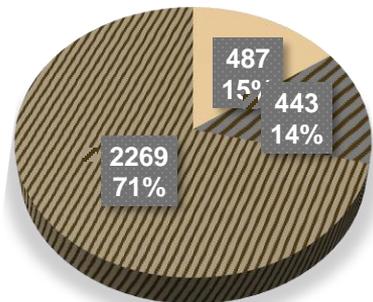

- ISTANZE IN ISTRUTTORIA USR AL 30/10/2022
- ISTANZE RIGETTATE/ARCHIVIAATE
- ISTANZE ACCOLTE

ISTANZE LAVORATE USR
85%

STATO istanze DANNO LIEVE COMUNI (O.C.99/2020)

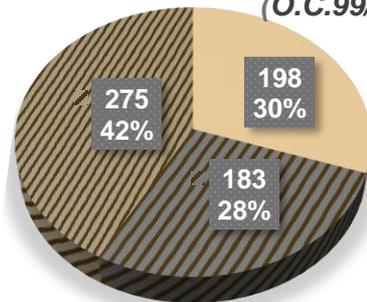

- ISTANZE IN ISTRUTTORIA AL 30/10/2022
- ISTANZE RIGETTATE/ARCHIVIAATE
- ISTANZE ACCOLTE

ISTANZE LAVORATE COMUNI
70%




UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA


VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016



STATO istanze USR Umbria

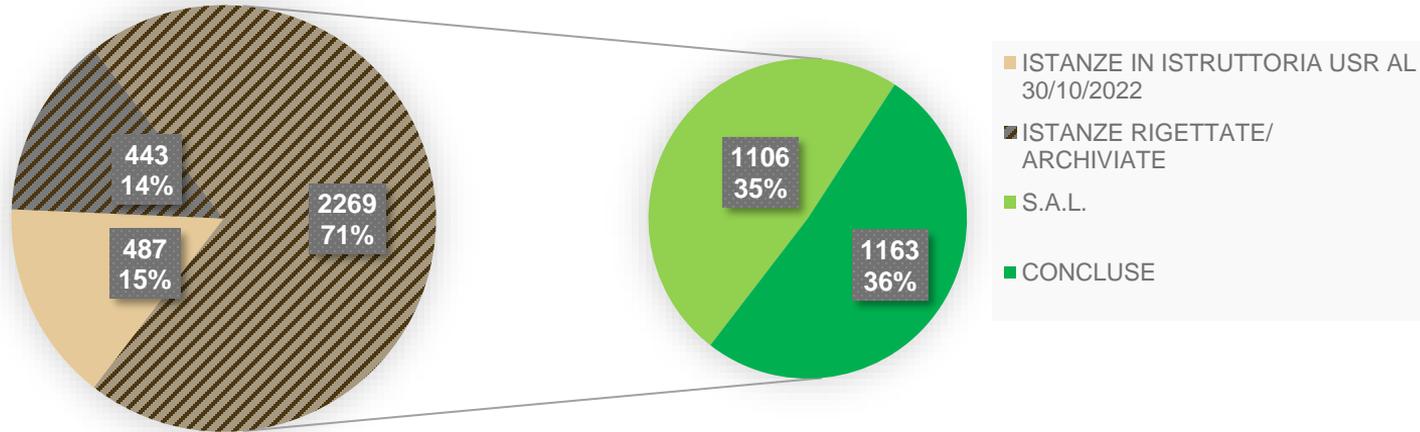

STATO istanze USR DANNI LIEVI

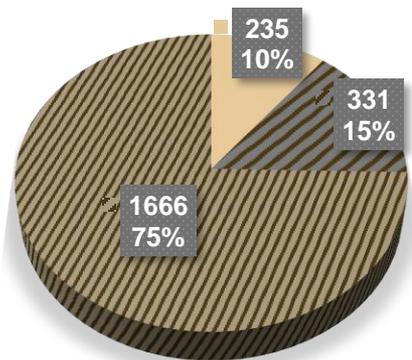


- ISTANZE DANNI LIEVI IN ISTRUTTORIA USR
- ISTANZE RIGETTATE/ARCHIVIAE
- ISTANZE ACCOLTE

Rispetto alle pratiche concesse al 30 ottobre 2022 risulta **attivato il 97% e concluso il 50% dei cantieri**, grazie agli sforzi profusi e al lavoro di squadra messo in atto dall'USR Umbria con la Regione Umbria, Struttura del Commissario, i Comuni, le Province e la Rete delle professioni tecniche.

Grazie alle semplificazioni introdotte con l'**ordinanza** commissariale **n. 100/2020** si è registrata una consistente accelerazione nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia, alla crisi energetica e all'aumento dei materiali da costruzione ai quali il Commissario ha fatto fronte, in particolare, con l'**ordinanza n. 126/2022**.



Situazione istanze USR DANNI GRAVI

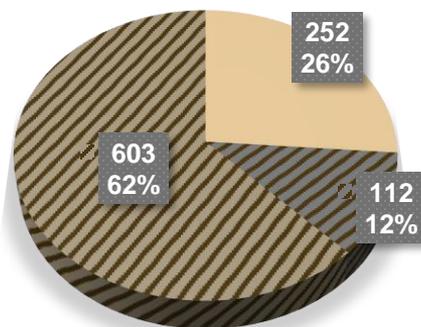

- ISTANZE DANNI GRAVI IN ISTRUTTORIA USR
- ISTANZE RIGETTATE/ARCHIVIAE
- ISTANZE ACCOLTE


IL PUNTO SULLA
RICOSTRUZIONE
PRIVATA

COMUNE	TOTALE DANNI LIEVI (art. 12 + art. 12BIS) Ord. n. 4, 8, 100				TOTALE DANNI GRAVI (art. 12 + art. 12BIS) Ord. n. 13, 19, 100				+ DANNI GRAVI			
	Tot. Pres.	Concesse	Respinte	In lav.	Tot. Pres.	Concesse	Respinte	In lav.	Tot. Pres.	Concesse	Respinte	In lav.
Arrone	21	16	4	1	7	4	2	1	28	20	6	2
Cascia	244	224	16	4	70	50	4	16	314	274	20	20
Cascia (O.C. 99/2000, dal 02/11/2020)	69	40	7	22	-	-	-	-	69	40	7	22
Cerreto di Spoleto	52	38	4	10	13	6	3	4	65	44	7	14
Ferentillo	39	19	9	11	6	5	-	1	45	24	9	12
Montefranco	13	12	1	-	1	1	-	-	14	13	1	-
Monteleone di Spoleto	52	47	3	2	12	7	2	3	64	54	5	5
Norcia	592	516	34	42	419	252	36	131	1.011	768	70	173
Norcia (O.C. 99/2000, dal 20/11/2020)	159	66	51	42	-	-	-	-	159	66	51	42
Poggiodoro	17	13	3	1	2	1	-	1	19	14	3	2
Polino	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Preci	95	83	6	6	62	37	8	17	157	120	14	23
Sant'Anatolia di Narco	28	15	7	6	5	4	1	-	33	19	8	6
Scheggino	18	9	5	4	-	-	-	-	18	9	5	4
Sellano	67	46	11	10	17	13	-	4	84	59	11	14
Spoleto	226	180	22	24	70	46	8	16	296	226	30	40
Spoleto (O.C. 99/2000, dal 19/10/2020)	428	169	125	134	-	-	-	-	428	169	125	134
Vallo di Nera	12	7	3	2	3	3	-	-	15	10	3	2
TOTALE	2.133	1.500	312	321	687	429	64	194	2.820	1.929	376	515

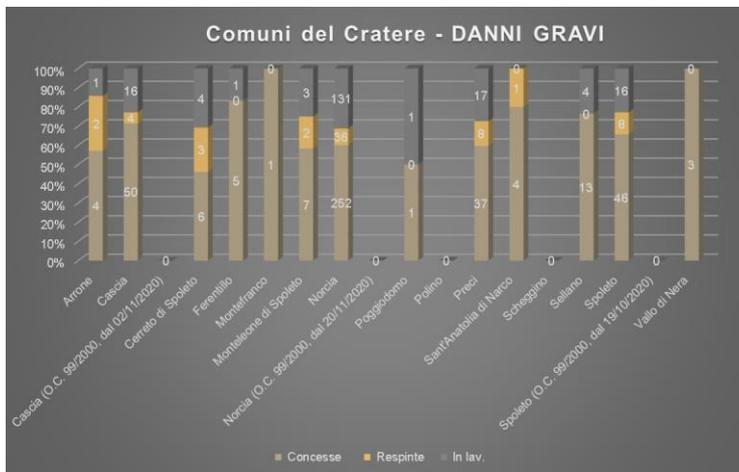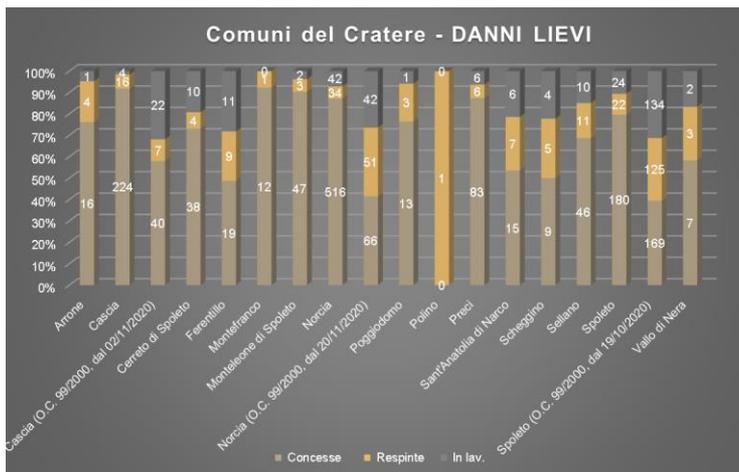


IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE COMUNI DEL CRATERE

PRATICHE PRESENTATE

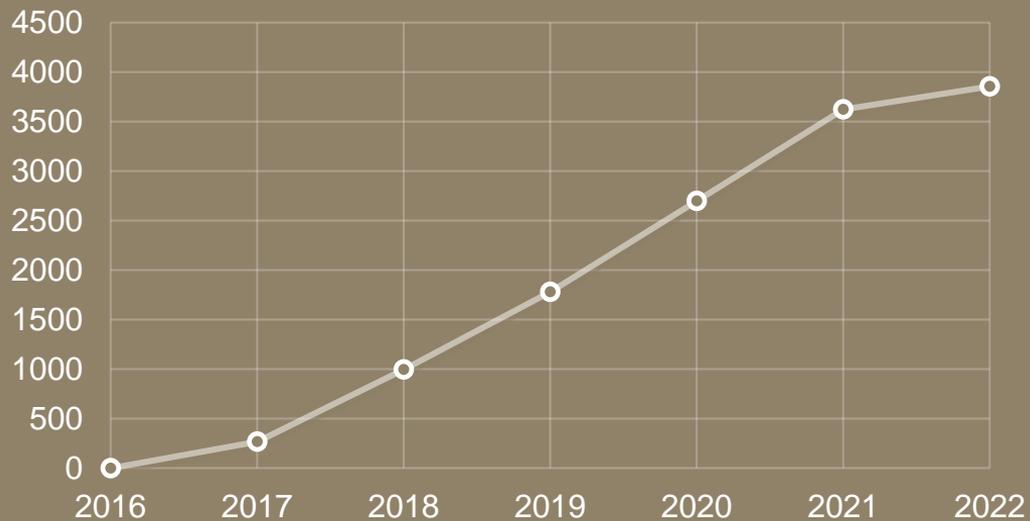


Nel grafico le istanze presentate all'USR Umbria.






NEGLI ULTIMI TRE ANNI

■ ISTANZE IN ISTRUTTORIA ■ ISTANZE ARCHIVIALE/RIGETTATE ■ ISTANZE ACCOLTE

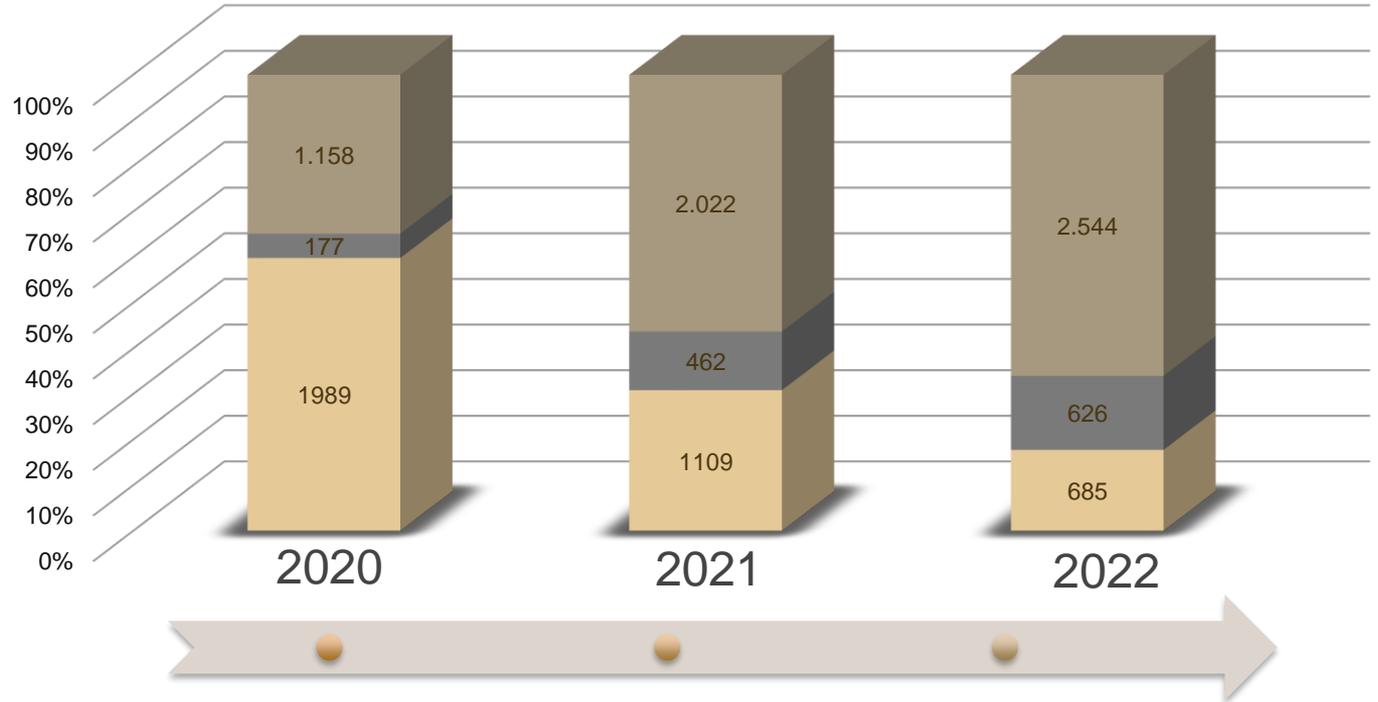

CONTRIBUTI LIQUIDATI

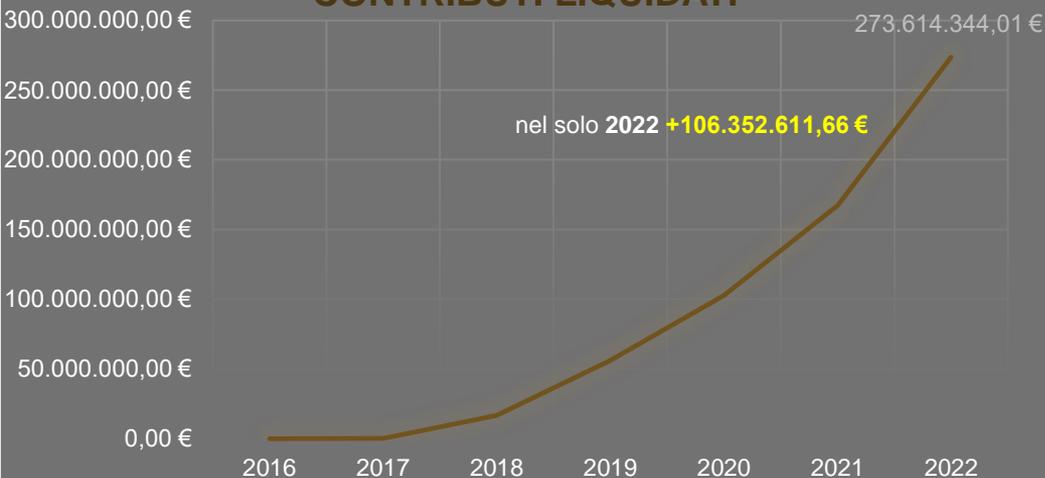

2022 SAL

Nel 2022 si è continuato a registrare un incremento delle richieste di erogazione di stati di avanzamento.

USR UMBRIA

Nei primi dieci mesi del 2022 sono stati ricevuti **992 sal**, pari al 25% del totale di quelli presentati dall'inizio della ricostruzione ad oggi.

EVASI

Nel solo 2022 ne sono stati erogati **927** grazie alla semplificazione introdotta dal decreto attuativo n. 627/2021 e ad una efficace organizzazione interna.

**EVASIONE STATI
AVANZAMENTO LAVORI
AL 30 SETTEMBRE 2022**

Importanza attività


Tale attività riveste a livello economico e sociale una **notevole importanza**: dall'avvio della ricostruzione al 30 ottobre 2022 sono stati liquidati importi pari a **€ 273.614.344,01 €** di cui **€ 106.352.611,66 €** nel solo 2022.

Ad oggi risultano in istruttoria i SAL ZERO presentati nel mese di ottobre 2022 e i SAL di settembre 2022, nel **rispetto delle tempistiche** previste dall'O.C. n. 118/2021.



L'impegno dell'USR Umbria si traduce anche in **attività complementari** a quelle di concessione contributiva...

ISTANZE LIVELLO OPERATIVO e AUTORIZZAZIONE AL MIGLIORAMENTO



EVASE ISTANZE ARCHIVIAATE/RIGETTATE ISTANZE IN ISTRUTTORIA

ISTANZE LAVORATE USR
94%

... Valutazione preventiva livello operativo e autorizzazione al miglioramento sismico

- Per un totale di **1840** istanze di cui:
- **1394** rilasciate
 - **326** rigettate o archiviate su istanza di parte

... Adempimenti per costruzioni in zona sismica

Dal 2021 sono in capo all'USR Umbria gli adempimenti per le costruzioni in zona sismica di cui agli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 38/2001, cui segue l'emissione delle autorizzazioni preventive e degli esiti favorevoli del controllo sugli atti progettuali per le verifiche a campione in corso d'opera (art. 2018 L.R. n. 1/2015)

L'USR Umbria è competente sia per i procedimenti in zona sismica per le istanze in capo ai comuni di Cascia, Norcia e Spoleto, sia nel rilascio dei pareri per la verifica di conformità delle norme tecniche vigenti per le opere di ricostruzione pubblica.

ATTIVITÀ
COMPLEMENTARI
USR UMBRIA



Aumento materie prime

Per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è stata emanata l'ordinanza commissariale n. 118/2021, rivista ed aggiornata dall'ordinanza n. 126/2022.

Quest'ultima interviene su:

- **Prezzario dei materiali e delle lavorazioni**
- **Costo parametrico**

Tuttò ciò ha comportato un considerevole **aggravio degli adempimenti** con conseguente **incremento del numero delle rideterminazioni** dei contributi e un **rallentamento nell'evasione delle concessioni contributive**



LE DIFFICOLTÀ ATTUALI

Carenza di imprese disponibili

Scarsa disponibilità e prezzi molto elevati di alcuni materiali

Ridotto numero professionisti e numero incarichi elevato

Crisi energetica



UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA

VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016



SCADENZE



- ❑ **20 DICEMBRE 2022:** è questo il **termine fissato per i residenti che beneficiano di CAS e SAE** e che non abbiano impedimenti oggettivi alla presentazione della richiesta di contributo (pena sospensione automatica CAS o dei canoni di locazione per chi si trova in immobili comunali o pubblici; cessazione temporanea gratuit  SAE, MAPRE e strutture equivalenti)
Impedimenti oggettivi previsti nelle note esplicative per l'attuazione dell'Ordinanza n. 123/2022:
 - **Delocalizzazione obbligatoria** ai sensi dell'art. 22 dell'O.C. n. 19/2017;
 - **Impedimenti di natura geomorfologica**
 - **Impedimenti di natura amministrativa o giudiziaria**
 - **Impedimenti indotti da provvedimenti sospensivi della pubblica amministrazione**
 - **altri casi** in cui sussistono specifiche e **documentate ragioni di impedimento** a presentare la richiesta di contributo di ricostruzione

- ❑ **31 DICEMBRE 2022:**   questo il **termine fissato al momento per tutti gli altri cittadini che posseggono immobili resi inagibili** per la presentazione della richiesta di contributo.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

30 OTTOBRE 2016 – 30 OTTOBRE 2022

Il percorso fatto insieme

sismaumbria2016.it



Opere pubbliche finanziate

Scuole ed istituti scolastici	94	€ 347.585.108,20
Edilizia residenziale pubblica	32	€ 24.929.890,92
Ospedali o strutture socio-sanitarie	6	€ 21.898.169,73
Municipi e palazzi comunali	15	€ 18.047.763,92
Dissesti	20	€ 16.8058.77,70
Cimiteri	15	€ 14.244.431,19
Luoghi di culto	13	€ 6.321.660,00
Caserme	2	€ 5.310.293,82
Viabilità	1	€ 391.000,00
Altre opere pubbliche	57	€ 47.161.735,69
Totale complessivo	255	€ 502.695.913,17

**IL PUNTO SULLA
RICOSTRUZIONE
PUBBLICA**



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA






O.C. 109/2020

Approvazione elenco unico dei **programmi delle opere pubbliche** nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica.

158 interventi - € 153.449.604,93

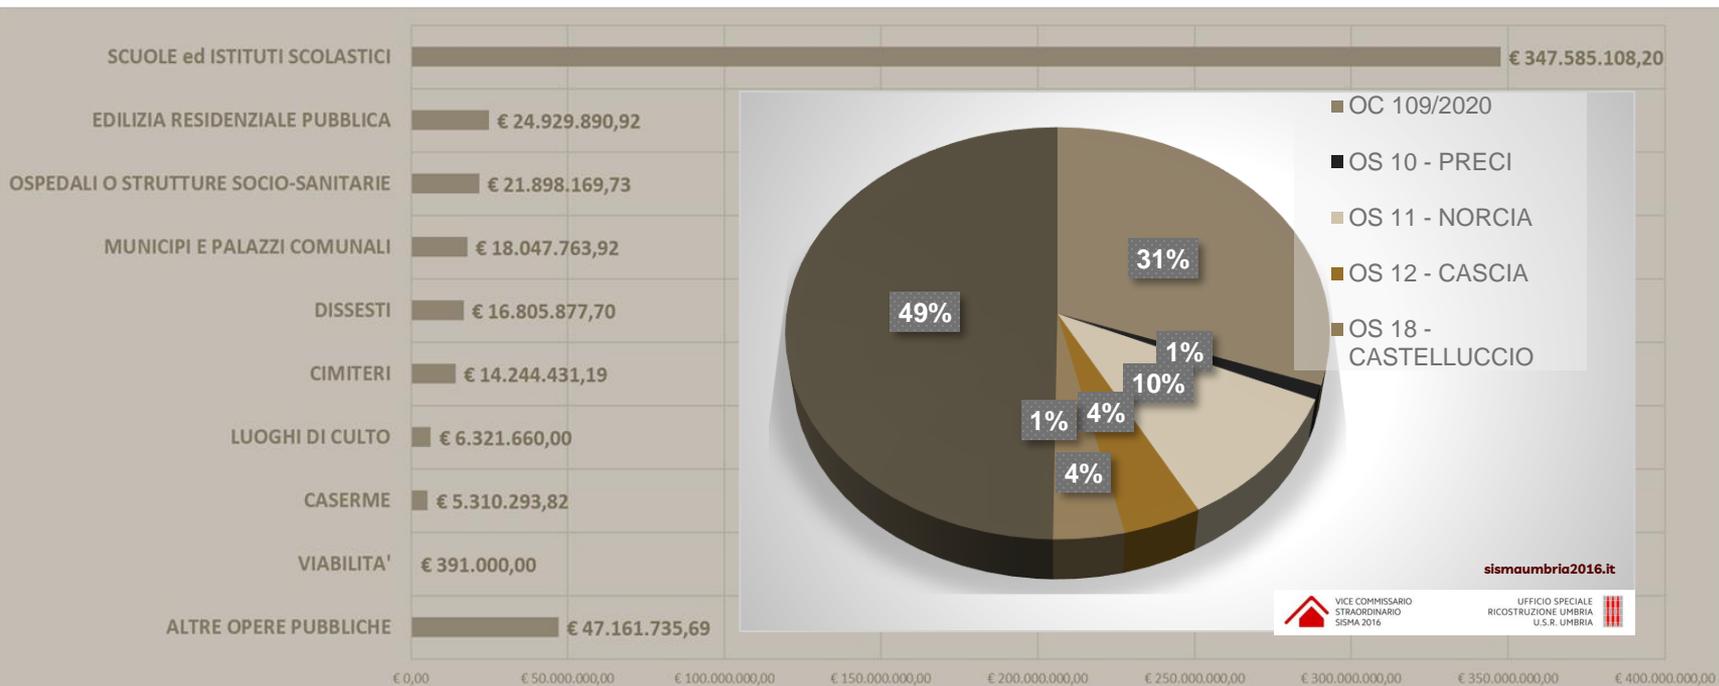

**OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI FINANZIATI**



O.S. 10/2021

Ricostruzione Abbazia di S. Eutizio nel comune di **Preci** ed altri interventi

7 interventi

€ 5.539.262,00



O.S. 11/2021

Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio del Comune di **Norcia**

10 interventi

€ 52.665.095,35



O.S. 12/2021

Interventi di ricostruzione nel comune di **Cascia**

5 interventi

€ 21.432.158,39



O.S. 18/2021

Interventi di ricostruzione nel centro storico di **Castelluccio** di Norcia

8 interventi

€ 19.448.860,00



O.S. 27/2021

Interventi di ricostruzione (...) immobili del patrimonio dell'Agenzia del Demanio

8 interventi

€ 4.491.000,00



O.S. 31/2021

Programma Straordinario di Ricostruzione (...) strutture scolastiche

59 interventi

€ 245.669.950,50

OPERE PUBBLICHE ORDINANZE SPECIALI

sismaumbria2016.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA






Opere pubbliche

Stato attuazione	Numero interventi	Percentuale
F1 – Non avviato procedura accordo quadro Invitalia	64	25,10%
F2 – Gara progettazione avviata	14	5,49%
F3 – Incarico progettazione affidato	88	34,51%
F3 1 – Istruttoria USR	46	18,04%
F4 – Progetto approvato	4	1,57%
F5 – Gara aggiudicazione lavori avviata	12	4,71%
F6 – Lavori in corso	19	7,45%
F7 – Lavori conclusi	7	2,75%
F9 Rinuncia/revoca/soppresso/sospeso/accorpato/scorporato	1	0,39%
Totale complessivo	255	

IL PUNTO SULLA
RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

BENI CULTURALI

Ordinanza Commissariale n. 20	20	€ 3.893.532,00
Ordinanza Commissariale n. 18	18	€ 4.205.500,00
Ordinanza Commissariale n. 17	17	€ 24.800.000,00
Ordinanza Commissariale n. 83	83	€ 39.750.000,00
Totale complessivo	138	€ 72.376.786,51

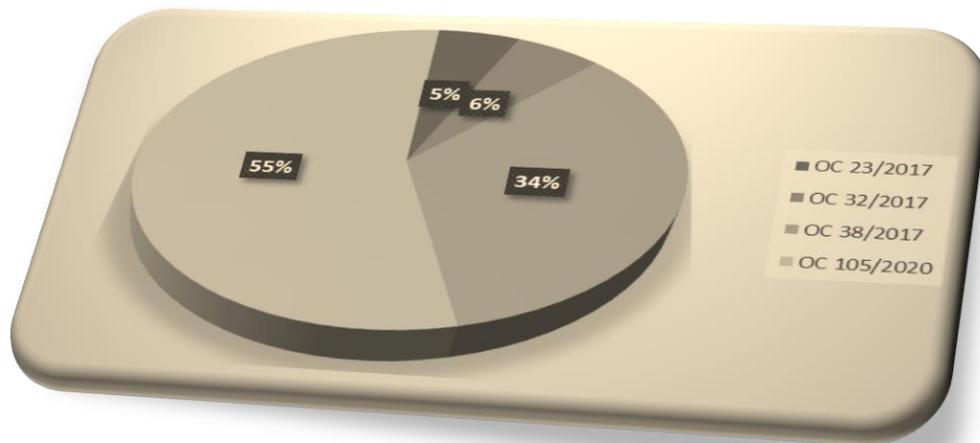

LA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA
BENI CULTURALI

F1 - NON AVVIATO	10
F2 - GARA PROGETTAZIONE AVVIATA	4
F3 - INCARICO PROGETTAZIONE AFFIDATO	79
F3-1 - ISTRUTTORIA USR	5
F5 - GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIATA	2
F6 - LAVORI IN CORSO	6
F7 - LAVORI CONCLUSI / COLLAUDATI	28
F9 - RINUNCIA/REVOCA/SOPPRESSO/SOSPESO/ACCORPATO/SCORPORATO	4
Totale complessivo	138


sismaumbria2016.it



LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA BENI CULTURALI



**RICOSTRUZIONE PUBBLICA
BENI CULTURALI**

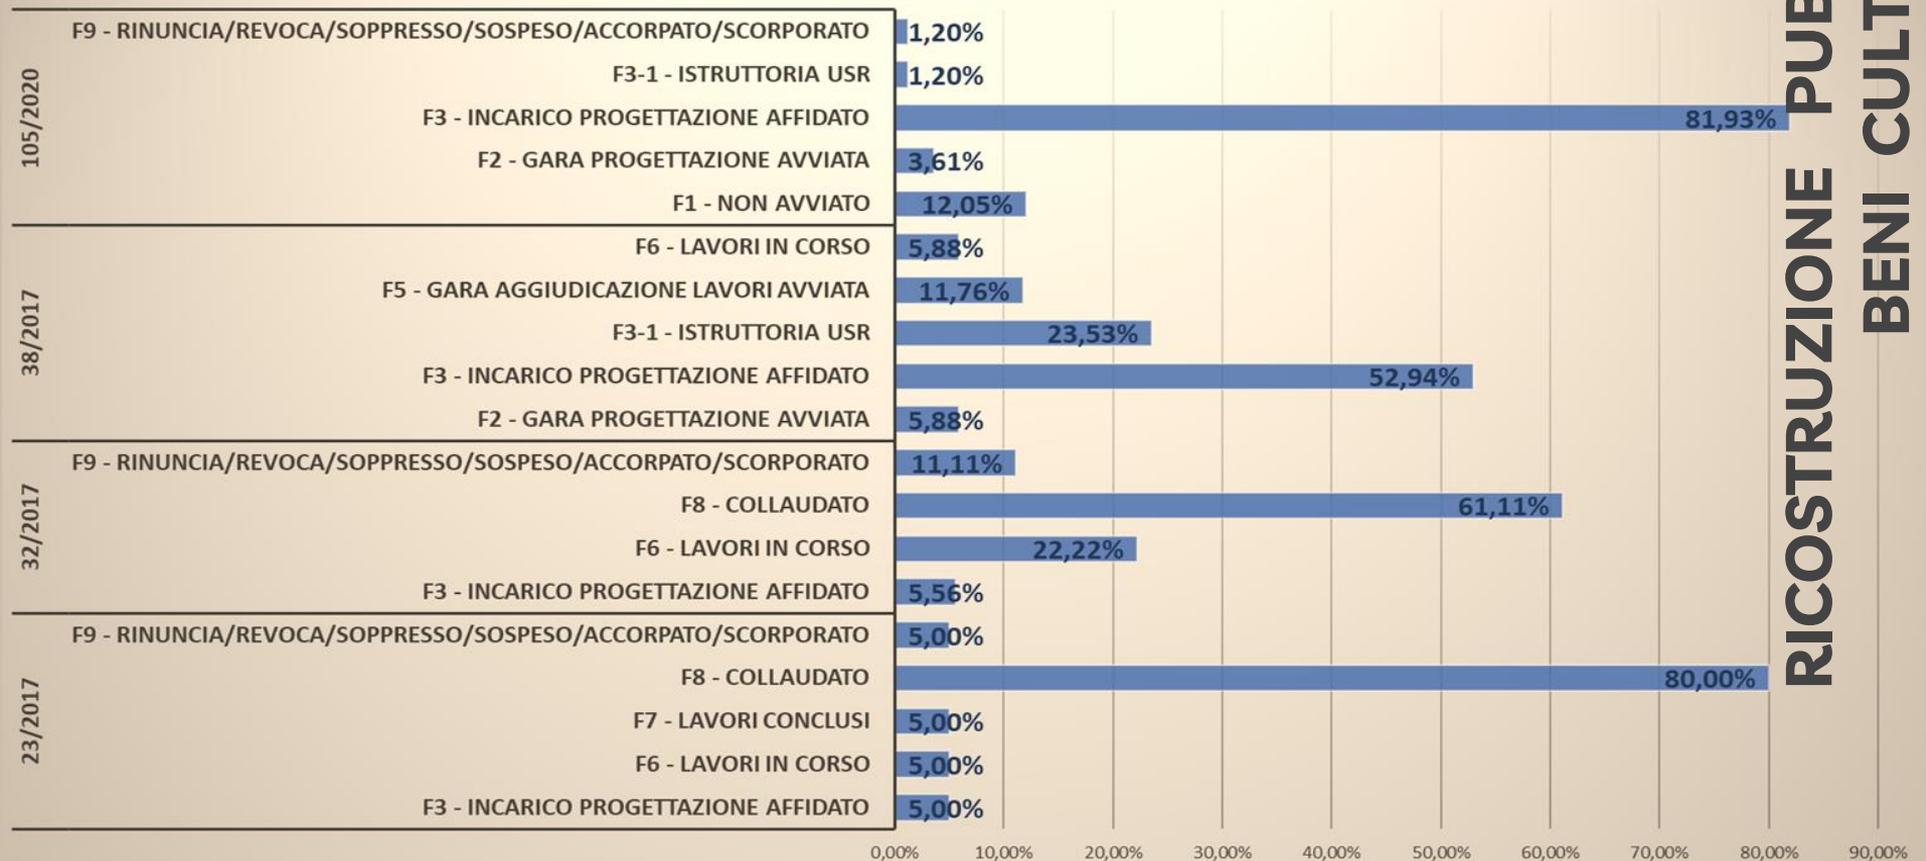





Descrizione	Località	Importo
Dotazioni apparecchiature per le scuole		€ 568,838,52
Restauro tele e dipinti		€ 116,600,00
Centri di comunità – Attività di ricerca		€ 25,000,00
Centri di comunità Ambito Territoriale 1	Piediripa – Savelli - Valcaldara (Norcia)	€ 1,066,500,00
Centri di comunità Ambito Territoriale n. 2 Lotto 1	Todiano (Preci) - Vallo di Nera capoluogo	€ 832,000,00
Centri di comunità Ambito Territoriale n. 2 Lotto 2	Collegiacone (Cascia)	€ 324,500,00
Centro di Comunità – Ambito Territoriale n. 3	Maltignano (Cascia) Monteleone di Spoleto (capoluogo)	€ 645,000,00
Centro di Comunità – Ambito Territoriale n. 4	Montebufo (Preci) – Preci capoluogo	€ 760,000,00
Centro di Comunità – Ambito Territoriale n. 5	Cascia	€ 479,858,24
TOTALE		€ 4,818,296,76

**RICOSTRUZIONE PUBBLICA
 SMS SOLIDALI**

RICOSTRUZIONE PUBBLICA SMS SOLIDALI



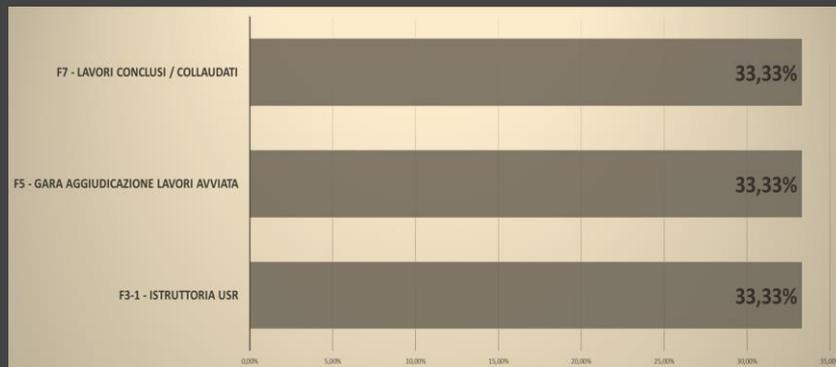

F1 – NON AVVIATO	0
F2 – GARA PROGETTAZIONE AVVIATA	0
F3 – INCARICO PROGETTAZIONE AFFIDATO	0
F3.1 – ISTRUTTORIA USR	3
F5 – GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIATA	0
F 6 – LAVORI IN CORSO	3
F7 – LAVORI CONCLUSI COLLAUDATI	3
F9 – RINUNCIA/REVOCA/SOPPRESSO/SOSPESO/ACCORPATI/SCORPORATO	0
TOTALE COMPLESSIVO	9



RICHIESTE DI ACCESSO AL FONDO (Periodo 24/05/2022 – 20/08/2022)


Art. 4, comma 3: Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica (Euro 100.000.000,00)

RICHIESTE PERVENUTE ALL'USR Umbria	7
IMPORTO TOTALE RICHIESTO	€ 794,002,45
Utilizzo Economie Programmazione USR Umbria	€ 148,476,33
Accesso al Conto Termico GSE	€ -
IMPORTO RICHIESTE ACCESSO AL FONDO	€ 645,524,12
Incremento medio delle richieste	15,55%

Art. 4, comma 6: Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali (Euro 40.000.000,00)


RICHIESTE PERVENUTE ALL'USR Umbria	2
IMPORTO RICHIESTE ACCESSO AL FONDO	€ 338.142,78
Incremento medio delle richieste	19,12%

**ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 126/2022**

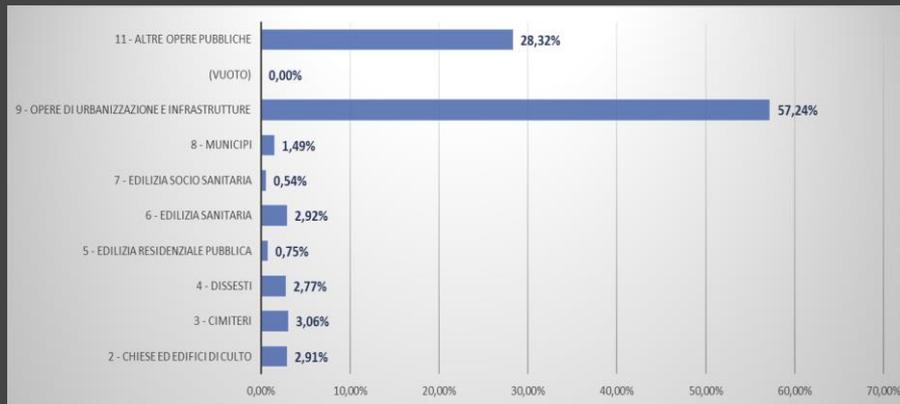


Censimento aggiornato dopo le verifiche di accettazione da parte dell'USR Umbria

DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTI
2 - Chiese ed edifici di culto	16	€ 17.221.021,00
3 - Cimiteri	62	€ 18.101.465,00
4 - Dissesti	19	€ 16.402.744,00
5 - Edilizia residenziale pubblica	12	€ 4.405.469,00
6 - Edilizia sanitaria	4	€ 17.288.895,00
7 - Edilizia socio sanitaria	3	€ 3.189.082,00
8 - Municipi	7	€ 8.780.802,00
9 - Opere di urbanizzazione e infrastrutture	300	€ 338.322.932,00
11 - Altre opere pubbliche	132	€ 167.379.912,00
Totale complessivo	555	€ 591.092.322,00

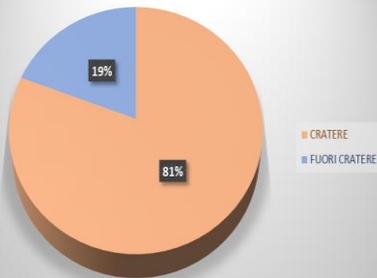


Crateri	435	€ 470.528.742,00
Fuori Crateri	120	€ 120.563.580,00
Totale	555	€ 591.092.322,00

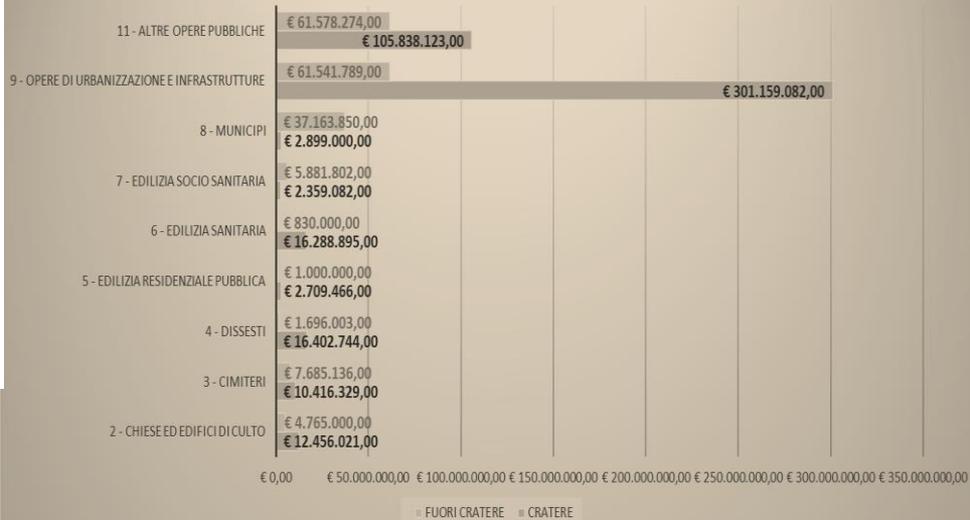

**RICOSTRUZIONE PUBBLICA
ULTERIORI ESIGENZE**

RICOSTRUZIONE ABBAZIA S. EUTIZIO NEL COMUNE DI PRECI

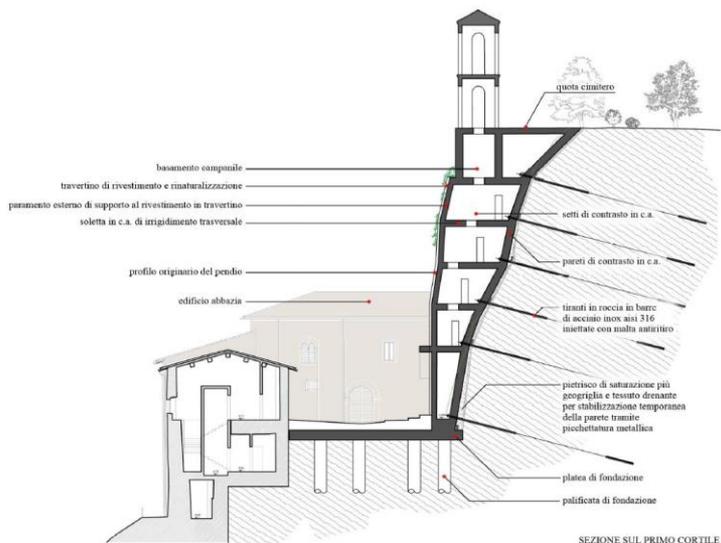

18 maggio 2022 = ABBAZIA DI S. EUTIZIO: conclusione della Conferenza Speciale di approvazione del progetto definitivo.

17 giugno 2022 = Decreto del Commissario Straordinario n. 307 per l'utilizzo del fondo di accantonamento e ulteriore finanziamento di Euro 822.663,87

2 agosto 2022 = Approvazione Progetto Esecutivo e Concessione del contributo di Euro 6.783.656,91 (USR Umbria - Decreto del Dirigente Delegato n. 521 del 02/08/2022)

Aggiudicati lavori - controllo requisiti per contratto

12 agosto 2022 = CONVENTO DI S. EUTIZIO: conclusione della Conferenza Speciale di approvazione del progetto esecutivo

3 ottobre 2022 = ABBAZIA: firmato il contratto per l'avvio dei lavori con la ditta C.E.S.A. di Città di Castello

ORDINANZA SPECIALE
N. 10 DEL 15/07/2021



INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI NORCIA



POLO SCOLASTICO DI NORCIA (Soggetto Attuatore: Provincia di Perugia)

- **18 maggio 2021** = Affidato incarico progettazione definitiva/esecutiva
- **1 agosto 2022** = Presentazione progetto definitivo
- **13 ottobre 2022** = Presentazione aggiornamento progetto definitivo
- **7 novembre 2022** = Convocata Conferenza Speciale approvazione Progetto Sefinitivo

PALAZZO MUNICIPALE (Soggetto Attuatore: Comune di Norcia)

- **2 febbraio 2022** = Aggiudicazione appalto lavori

OSPEDALE DI NORCIA (Soggetto Attuatore: Regione Umbria)

- **25 luglio 2022** = Avvio procedura negoziata appalto lavori (con progettazione esecutiva)
- **5 agosto 2022** = Conclusione Procedura negoziata e individuazione aggiudicatario appalto lavori con progettazione esecutiva e controllo requisiti per contratto
- **12 agosto 2022** = Aggiudicati i lavori

PALAZZO SOLFERINO (Soggetto Attuatore: Comune di Norcia)

- **14 giugno 2022** = Richiesta incremento finanziamento per adeguamento prezzi
- **5 agosto 2022** = Decreto Commissario per finanziamento adeguamento prezzi

ORDINANZA SPECIALE
N. 11 DEL 15/07/2021

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI CASCIA




3 giugno 2022 = OSPEDALE DI CASCIA
(Soggetto attuatore: Regione Umbria)
Conclusione indagine di mercato appalto
lavori con progettazione esecutiva



**ORDINANZA SPECIALE
N. 12 DEL 15/07/2021**

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

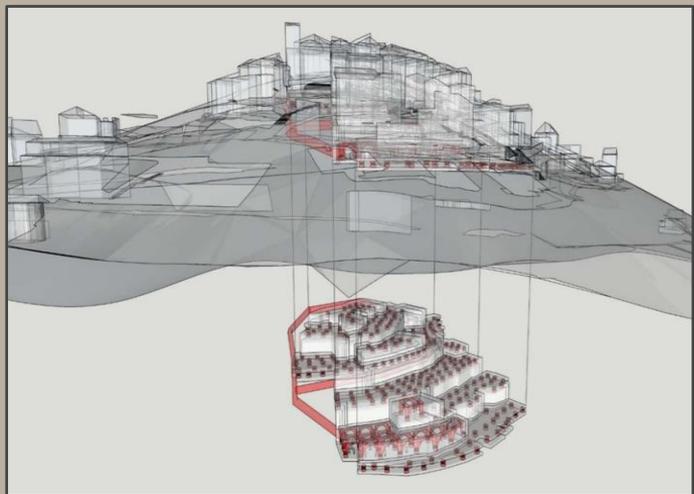

8 settembre 2021

Accordo tra Regione Umbria, USR Umbria, Università degli Studi di Perugia, Comune di Norcia per 'Studi applicativi di una soluzione di isolamento sismico al suolo (Ground isolation) per la ricostruzione di Castelluccio.

30 dicembre 2021

Piano attuativo di Castelluccio ottiene il via libera dalla conferenza permanente convocata dal Commissario straordinario.

14 marzo 2022 = *Il Consiglio Comunale di Norcia approva il Piano Attuativo di Castelluccio dando così il via libera a tutte le attività di progettazione e successiva realizzazione.*

3 giugno 2022 = *Scade l'avviso pubblicato il 10 maggio 2022 dall'USR Umbria per affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione degli 'Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia' per un importo di € 6.107.543,49.*

27 giugno 2022 = *Chiusura manifestazione di Interesse per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Operatori economici ammessi alla fase di verifica dei requisiti otto operatori economici da invitare alla successiva ed eventuale procedura negoziata (5).*

Documentazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attualmente in controllo preventivo ANAC

6 settembre 2022 = *Completate le demolizioni di Castelluccio*

ORDINANZA SPECIALE
N. 18 DEL 15/07/2021

I NUMERI DELLA PIASTRA GRADONATA



350
metri di perimetro



6200
metri quadri



24
metri di dislivello



17
aggregati



144
Unità immobiliari



2
edifici di culto

**ORDINANZA SPECIALE
N. 18 DEL 15/07/2021**

sismaumbria2016.it



FASE 1

1 - Realizzazione interventi pubblici individuati come opere funzionali e necessari per la ripresa del borgo indipendenti dall'intervento unitario


2 - Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante Nord consolidamento del versante Nord del centro storico. Predisposizione atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione di Castelluccio.

3 - Affidamento dei servizi di progettazione della ricostruzione di Castelluccio e dell'intervento unitario.


FASE 1



4 - Realizzazione interventi pubblici individuati come funzionali e necessari per la ripresa di Castelluccio

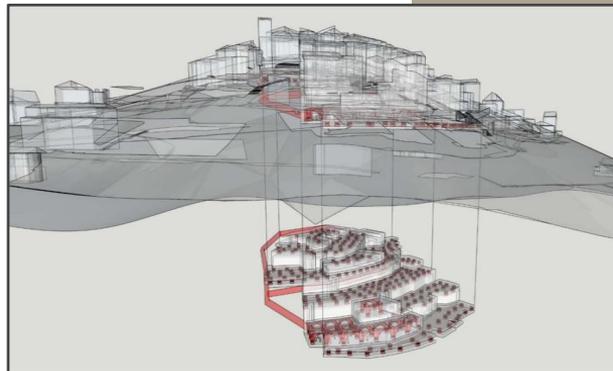

**ORDINANZA SPECIALE
N. 18 DEL 15/07/2021**

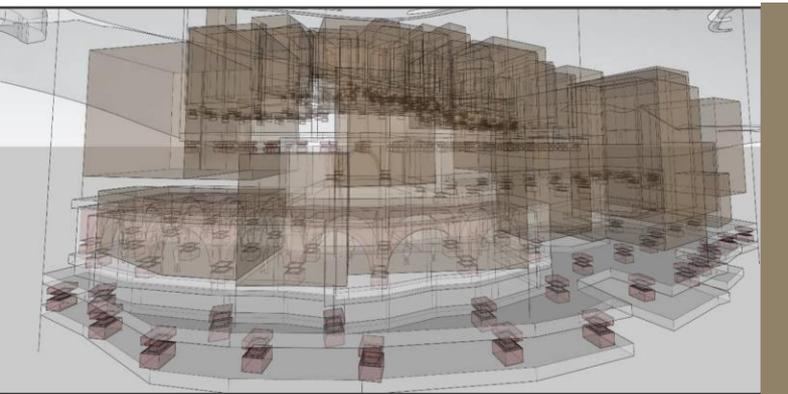

INT. 3 = € 2.734.500,00

Ripristino strade principali e secondarie del nucleo abitato

INT. 4 = € 4.946.250,00

Terrazzamenti nel nucleo abitato

INT. 5 = € 4,747,70,00

Sottoservizi nel nucleo abitato

INT. 6 = € 1.510.420,00

Realizzazione degli spazi pubblici

INT. 7 = € 1.760.000,00

Realizzazione parcheggi interrati

INT. 8 = € 165.825,00

Realizzazione di percorsi pedonali e di sicurezza

**ORDINANZA SPECIALE
N. 18 DEL 15/07/2021**




Le opere di riedificazione complessiva di Castelluccio, non ricomprese nell'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 18/2021, e pertanto anch'esse oggetto di programmazione e finanziamento successivo consistono in:

17 AGGREGATI =
€ 20.130.500,00

2 CHIESE =
Santa Maria Assunta
Oratorio SS Sacramento
€ 4.500.000,00

PIASTRE GRADONATE =
Sismicamente isolate alla base e locali ipogei
€ 3.500.000,00

ORDINANZA SPECIALE
N. 18 DEL 15/07/2021


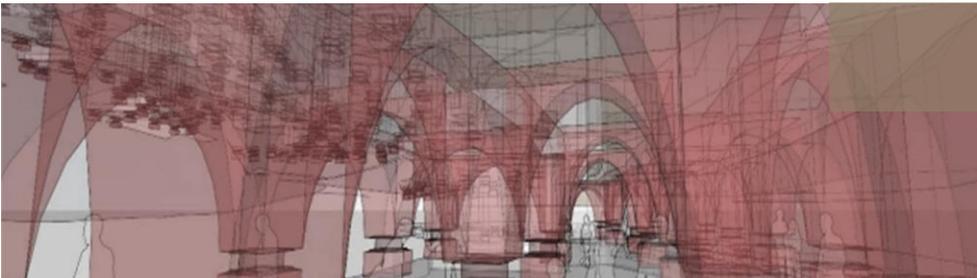


STEP 1 , 2

Terrazzamenti, cunicoli tecnologici,
strade principali e secondarie
limitatamente alla porzione del
nucleo abitato esterno alla piastra

Luglio 2023

Edifici di culto. Piastra,
sottoservizi strade locali
ipogei ed edifici di culto
Cassero
Luglio 2023

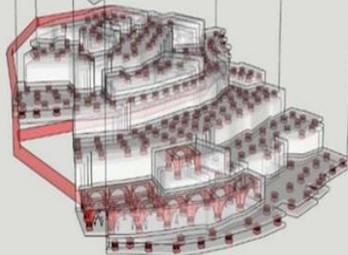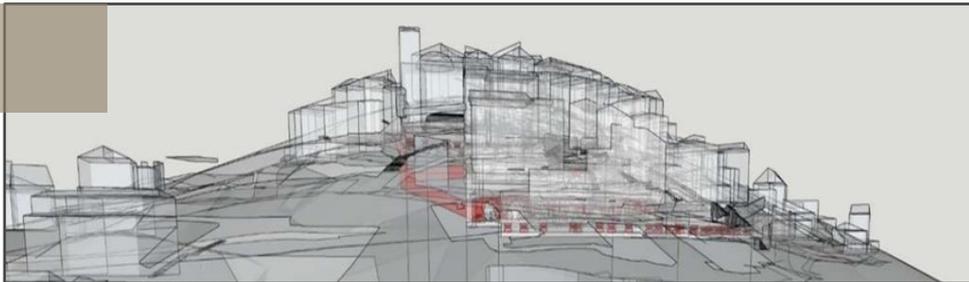

STEP 3


Piastra cassero. Piastra cassero
Completamento step 2 = strade
principali e secondarie sui
terrazzamenti esterni alla piastra isolata

Luglio 2026

ORDINANZA SPECIALE
N. 18 DEL 15/07/2021

**RICOSTRUZIONE PUBBLICA PNRR
 FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA
 CENTRO ITALIA 2016**

Misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili»	Linea Intervento 1: Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici	3	sismaumbria2016.it € 20.650.000,00
Misura A3 «Rigenerazione urbana e territoriale»	Linea Intervento 1: Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città	27	€ 18.760.000,00
Misura A3 «Rigenerazione urbana e territoriale»	Linea Intervento 2: Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali	2	€ 9.750.000,00
Misura A3 «Rigenerazione urbana e territoriale»	Linea Intervento 3: Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita	9	€ 10.000.000,00
Misura A4 «Infrastrutture e mobilità»	Linea Intervento 2: Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili	1	€ 22.000.000,00
Misura A4 «Infrastrutture e mobilità»	Linea Intervento 3: Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie	2	€ 5.000.000,00
Misura A4 «Infrastrutture e mobilità»	Linea Intervento 4: Interventi sulla rete stradale	2	€ 20.000.000,00
Misura A4 «Infrastrutture e mobilità»	Linea Intervento 5: Interventi sulla rete stradale comunale	32	€ 5.628.000,00
Totale		78	€ 111.788.000,00

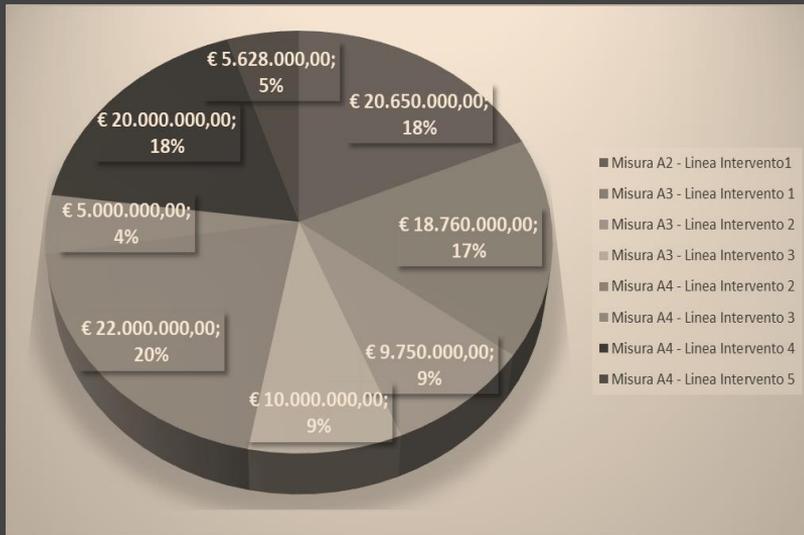

Misura A2 - Linea Intervento1	3	€ 20.650.000,00
Misura A3 - Linea Intervento 1	27	€ 18.760.000,00
Misura A3 - Linea Intervento 2	2	€ 9.750.000,00
Misura A3 - Linea Intervento 3	9	€ 10.000.000,00
Misura A4 - Linea Intervento 2	1	€ 22.000.000,00
Misura A4 - Linea Intervento 3	2	€ 5.000.000,00
Misura A4 - Linea Intervento 4	2	€ 20.000.000,00
Misura A4 - Linea Intervento 5	32	€ 5.628.000,00

USR UMBRIA
STATO DI ATTUAZIONE
AL 15 OTTOBRE 2022



PROGETTI APPROVATI
100%

Misura A3 «Rigenerazione urbana e territoriale»	Linea Intervento 1: Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città	22	€ 18.760.000,00
Misura A3 «Rigenerazione urbana e territoriale»	Linea Intervento 2: Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali	2	€ 9.750.000,00
Misura A3 «Rigenerazione urbana e territoriale»	Linea Intervento 3: Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita	9	€ 10.000.000,00
Misura A4 «Infrastrutture e mobilità»	Linea Intervento 5: Interventi sulla rete stradale comunale	18	€ 5.628.000,00
	Totale	55	€ 44.138.000,00



FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI

Adegamenti prezzi ai sensi dall'art. 29 del
D.L. 144 del 23/09/2022

Preassegnazione ulteriori risorse del +15%

Richiesta preassegnazione per 40 interventi per un totale di
ulteriori Euro 5.486.700,00

RICOSTRUZIONE PUBBLICA PNRR
FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA
CENTRO ITALIA 2016



**Individuati 95
interventi per un
importo complessivo
di € 59.027.895**

Comitato istituzionale 5 ottobre 2022

Approvata proposta

«Nuovo programma interventi di ricostruzione pubblica»

(PNRR) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



27

**INTERVENTI NEI COMUNI DEL CRATERE PER
€ 17.056.929**



68

**INTERVENTI NEI COMUNI FUORI CRATERE PER
€ 41.970.966,00**

**NUOVA PROPOSTA DI PIANO DELLE
OPERE PUBBLICHE**



PNRR

FONDO COMPLEMENTARE
AREE SISMA CENTRO ITALIA
2009 - 2016

Comitato istituzionale 5 ottobre 2022

Approvata proposta
«Programma Unitario di rigenerazione urbana per le aree del
terremoto 2009 e 2019 – Scheda 2»

Individuati 54 interventi
nei Comuni del Cratere
per un importo
complessivo di
€ 70.001.214



NUOVA PROPOSTA PNRR SCHEDA 2



ORDINANZA COMMISSARIALE N. 128/2022
Approvazione Programma stralcio degli
edifici di culto per l'ottavo centenario dalla
morte di San Francesco d'Assisi Patrono
d'Italia (...)

*Art. 1 – Programma degli interventi sugli
edifici di culto della cultura Francescana*

Approvazione protocollo d'Intesa
sottoscritto in data 15 aprile 2022 tra il
Commissario Straordinario, la Presidente
della Regione Umbria-Vice Commissario
alla ricostruzione, il legale rappresentante
della Provincia Serafica di san Francesco
d'Assisi dell'Ordine dei Frati Minori
dell'Umbria, in parrepresentanza altresì della
Provincia di S. Chiara dei Frati Minori e
della Basilica di S. Maria degli Angeli e il
legale rappresentante della Custodia
Generale del Sacro Convento di San
Francesco in Assisi dei frati Minori
Conventuali.

**ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 128
DEL 13/10/2022**

Grazie per l'attenzione

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria
Via Romana Vecchia snc
06034 Foligno (Perugia)

Viale della Stazione snc
06046 Norcia (Perugia)

sismaumbria2016.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA

